

Energetyka: OPTiCoalMine (wycofana)



Usługa Energetyka: OPTiCoalMine została wycofana

- [1. Krótki opis usługi](#)
- [2. Aktywowanie usługi](#)
- [3. Pierwsze kroki](#)
- [4. Zaawansowane użycie](#)
- [Gdzie szukać dalszych informacji?](#)

1. Krótki opis usługi

Usługa obliczeniowa **OPTiCoalMine** przeznaczona jest do optymalizacji produkcji w podziemnych kopalniach węgla kamiennego stosujących ścianowy system eksploatacji.

Opracowany model obliczeniowy umożliwia odwzorowanie planowanych robót eksploatacyjnych w kopalni lub grupie kopalń węgla kamiennego z uwzględnieniem aspektu ryzyka związanego z procesem wydobywczym.

Zaprojektowany algorytm ewolucyjny (oparty na programowaniu ewolucyjnym z selekcją elitarną) umożliwia wybór najlepszego wariantu prowadzenia robót ze względu na wybrane kryterium.

Usługa może znaleźć zastosowanie:

- w ocenie propozycji rozcięcia złoża,
- przy wyznaczaniu kolejności eksploatacji partii pokładów,
- przy doborze wyposażenia do planowanych wyrobisk.

2. Aktywowanie usługi

Aby korzystać z zasobów obliczeniowych PL-Grid należy założyć konto użytkownika.

2.1. Zakładanie konta w portalu PL-Grid

Pierwszym krokiem jest rejestracja nowego użytkownika w portalu PL-Grid (portal.plgrid.pl). Dokładny opis rejestracji w portalu można znaleźć tutaj: <https://docs.cyfronet.pl/display/PLGDoc/Rejestracja>.

2.2. Uzyskanie certyfikatu Simple CA

Po zalogowaniu się na swoje konto w portalu PL-Grid, należy wygenerować [certyfikat Simple CA](#).


2.3. Aktywacja usługi OPTiCoalMine

W celu skorzystania z usługi **OPTiCoalMine** należy skorzystać z Katalogu Usług i Aplikacji (<https://docs.cyfronet.pl/pages/viewpage.action?pageId=23628883>).

3. Pierwsze kroki


3.1. Okno startowe usługi

Usługa **OPTiCoalMine** jest udostępniona w [Wirtualnym Laboratorium GridSpace 2](#) (Rys. 1).

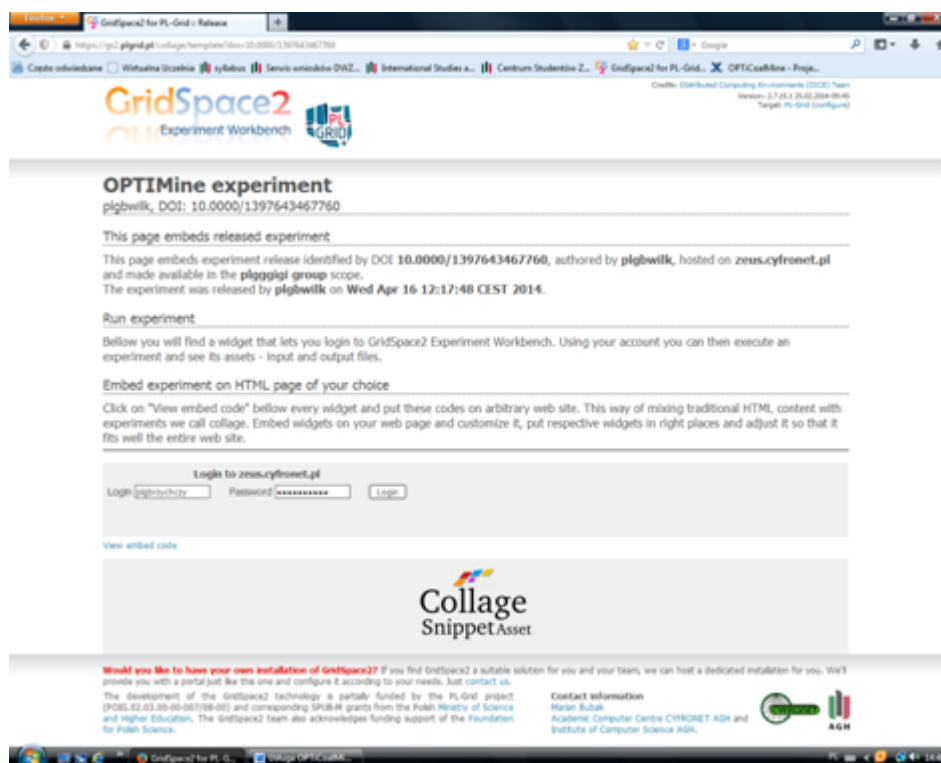

Rys. 1

Po zalogowaniu na klaster ZEUS, otwiera się strona eksperymentu umożliwiająca przeprowadzenie obliczeń z wykorzystaniem opracowanej usługi (Rys. 2).

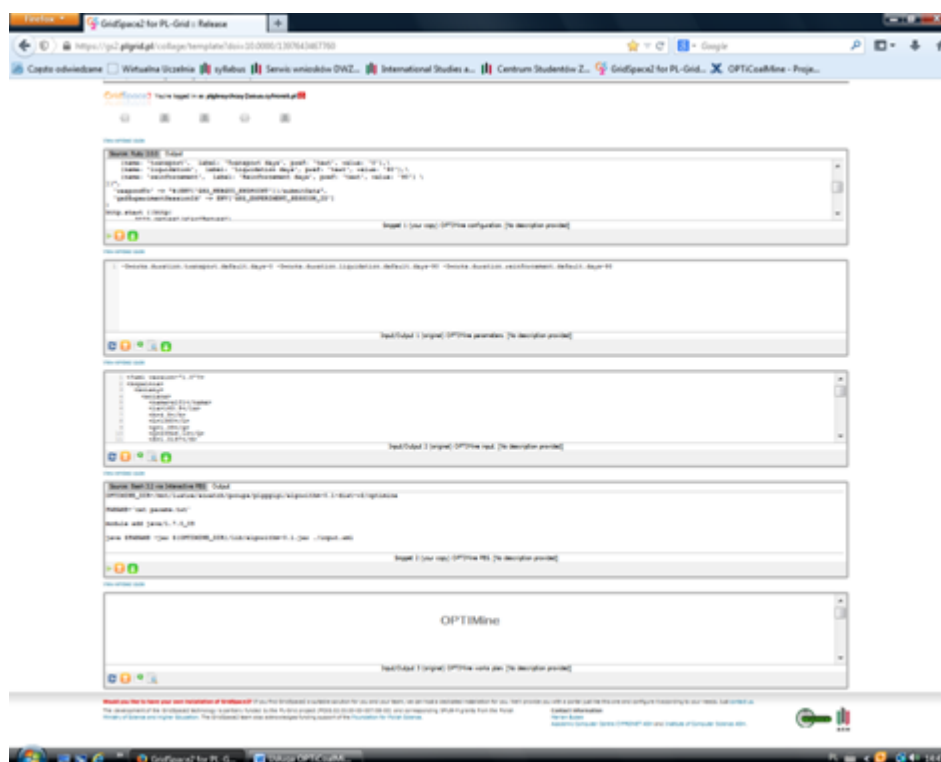

Rys. 2

Widok na stronie usługi obejmuje pięć części:

1. Okno 1 - **Snippet 1 OPTIMine configuration** – kod umożliwiający wprowadzenie nowych ustawień parametrów algorytmu obliczeniowego.
2. Okno 2 - **Input/Output 1 OPTIMine parameters** – okno umożliwiający podgląd i edycję wprowadzonych parametrów algorytmu.
3. Okno 3 - **Input/Output 2 OPTIMine input** – okno umożliwiający podgląd i edycję danych wejściowych do algorytmu.

4. Okno 4 - **Snippet 2 OPTiMine PBS** – okno umożliwiające uruchomienie usługi OPTiCoalMine, uruchomienie kolei PBS na klastrze ZEUS oraz podgląd postępu obliczeń.
5. Okno 5 - **Input/Output 3 OPTiMine works plan** – okno umożliwiające podgląd i edycję danych wyjściowych z usługi.

3.2. Przygotowanie danych wejściowych

Aby móc skorzystać z usługi należy przygotować plik .xml o odpowiedniej strukturze (Rys. 3). Można w tym celu wykorzystać opublikowany na stronie usługi w Oknie 3 plik (ściągnięcie jest możliwe poprzez ikonę *download file* (Rys. 4)).

```
<?xml version="1.0"?>
- <kopalnia>
  + <ściany>
  + <ciągi>
  + <zestawy>
  + <mws>
  + <mps>
  + <mos>
</kopalnia>
```

Rys. 3. Struktura plik wejściowego do usługi



Rys. 4. Okno 3 usługi

Struktura pliku (Rys.3) składa się z następujących części:

- "ściany", w której zapisane są parametry projektowanych wyrobisk ścianowych,
- "ciągi", w której zapisane są dane dotyczące ciągów produkcyjnych,
- "zestawy", w której określone zostają zestawy (kompleksy) ścianowe,
- "mws", w której zapisane jest przyporządkowanie zestawów ścianowych do projektowanych wyrobisk ścianowych,
- "mps", w której zapisane są wartości średnie rozkładu postępu robót eksploatacyjnych w projektowanych wyrobiskach, przy wykorzystaniu zdefiniowanych zestawów ścianowych,
- "mos", w której zapisane są wartości odchyień standardowych rozkładu postępu robót eksploatacyjnych w projektowanych wyrobiskach, przy wykorzystaniu zdefiniowanych zestawów ścianowych.

Przykład zapisu danych w sekcji "ściany" przedstawiono na Rys. 5. Przedstawiony fragment zapisu dotyczy dwóch wyrobisk w kopalni nr 1, w ciągu nr 1. (Parametry, które są podawane dla projektowanych wyrobisk ścianowych: name - nazwa wyrobiska, ls - długość ściany [m], h - wysokość ściany [m], L - wybieg ściany [m], g - ciężar objętościowy [Mg/m³], Q - wartość opałowa węgla [KJ/kg], S - zasiarczenie węgla [%], A - zapocielenie węgla [%]).

```
<?xml version="1.0"?>
- <kopalnia>
  - <ściany>
    - <ściana>
      <name>s111</name>
      <ls>200</ls>
      <h>2.50</h>
      <L>17500</L>
      <g>1.30</g>
      <Q>21696</Q>
      <S>1.73</S>
      <A>16</A>
    </ściana>
    - <ściana>
      <name>s112</name>
      <ls>200</ls>
      <h>2.5</h>
      <L>1650</L>
      <g>1.35</g>
      <Q>21696</Q>
      <S>1.73</S>
      <A>16</A>
    </ściana>
  </ściany>
</kopalnia>
```

Rys. 5. Parametry projektowanych wyrobisk

Kolejnym elementem, szczególnie ważnym dla algorytmu obliczeniowego, jest wskazanie następstwa czasowego projektowanych wyrobisk ścianowych (określenie ciągów produkcyjnych) oraz ich wzajemnych zależności w czasie (wskazanie dat początku ciągów produkcyjnych). Na Rys. 6 wskazano sposób zapisu tych danych.

```
<?xml version="1.0"?>
- <kopalnia>
  + <sciany>
    - <ciagi>
      - <ciag>
        <name>CP11</name>
        <start>634352787653622800</start>
        - <sciany>
          <sciana>s112</sciana>
          <sciana>s113</sciana>
          <sciana>s111</sciana>
        </sciany>
      </ciag>
      - <ciag>
        <name>CP12</name>
        <start>634431744000000000</start>
        - <sciany>
          <sciana>s121</sciana>
          <sciana>s122</sciana>
          <sciana>s123</sciana>
        </sciany>
      </ciag>
    </ciagi>
  </sciany>
</kopalnia>
```

Rys. 6. Definiowanie ciągów produkcyjnych

Przedstawione dane dotyczą dwóch ciągów produkcyjnych, dla których podano: name - nazwa ciągu, start - data rozpoczęcia ciągu, ściana - wyrobisko ścianowe wchodzące w skład ciągu produkcyjnego. Kolejność zapisu wyrobisk w ciągu wskazuje na ich następstwo czasowe. W kolejnej sekcji pliku znajdują się nazwy zestawów ścianowych, które są możliwe do zastosowania w projektowanych wyrobiskach (Rys.7).

```
<?xml version="1.0"?>
- <kopalnia>
  + <sciany>
  + <ciagi>
  - <zestawy>
    <zestaw>Z1</zestaw>
    <zestaw>Z2</zestaw>
    <zestaw>Z3</zestaw>
    <zestaw>Z4</zestaw>
    <zestaw>Z5</zestaw>
    <zestaw>Z7</zestaw>
    <zestaw>Z8</zestaw>
    <zestaw>Z9</zestaw>
    <zestaw>Z6</zestaw>
    <zestaw>Z10</zestaw>
```

Rys. 7. Określenie zestawów ścianowych

Kolejnym elementem pliku jest zapis przyporządkowania zestawów ścianowych do planowanych wyrobisk (Rys. 8).

```
<?xml version="1.0"?>
- <kopalnia>
  + <sciany>
  + <ciagi>
  + <zestawy>
  - <mws>
    <wyposazenie zestaw="Z1" sciana="s111">0.6</wyposazenie>
    <wyposazenie zestaw="Z1" sciana="s112">0.6</wyposazenie>
    <wyposazenie zestaw="Z2" sciana="s111">0.2</wyposazenie>
    <wyposazenie zestaw="Z3" sciana="s111">0.2</wyposazenie>
    <wyposazenie zestaw="Z2" sciana="s112">0.2</wyposazenie>
    <wyposazenie zestaw="Z3" sciana="s112">0.2</wyposazenie>
    <wyposazenie zestaw="Z1" sciana="s113">0.6</wyposazenie>
    <wyposazenie zestaw="Z2" sciana="s113">0.2</wyposazenie>
    <wyposazenie zestaw="Z3" sciana="s113">0.2</wyposazenie>
    <wyposazenie zestaw="Z6" sciana="s121">0.2</wyposazenie>
    <wyposazenie zestaw="Z7" sciana="s121">0.1</wyposazenie>
    <wyposazenie zestaw="Z8" sciana="s121">0.1</wyposazenie>
    <wyposazenie zestaw="Z9" sciana="s121">0.1</wyposazenie>
    <wyposazenie zestaw="Z10" sciana="s121">0.1</wyposazenie>
    <wyposazenie zestaw="Z11" sciana="s121">0.1</wyposazenie>
    <wyposazenie zestaw="Z12" sciana="s121">0.1</wyposazenie>
    <wyposazenie zestaw="Z13" sciana="s121">0.1</wyposazenie>
```

Rys. 8. Przyporządkowanie zestawów ścianowych do projektowanych wyrobisk

Z uwagi na niepewność związaną z dostępnością określonego typu wyposażenia, w algorytmie obliczeniowym umożliwiono wprowadzenie zapisu prawdopodobieństwa przyporządkowania danego zestawu do wyrobiska ścianowego (dla poprawnego działania algorytmu konieczne jest zachowanie zasady, aby suma prawdopodobieństw wynikająca z możliwości przyporządkowania zestawów w danym wyrobisku była równa 1). W takim przypadku algorytm losuje przyporządkowanie z dostępnych opcji.

Następną grupą danych w pliku są parametry rozkładu robót eksploatacyjnych w planowanych wyrobiskach przy zastosowaniu zdefiniowanych zestawów ścianowych. Przyjęto, że postęp tych robót jest zmienną losową o rozkładzie normalnym. W kolejnych częściach należy podać wartość średnią postępu robót eksploatacyjnych (Rys. 9) i odchylenie standardowe (Rys. 10)

```
<?xml version="1.0"?>
- <kopalnia>
  + <sciany>
  + <ciagi>
  + <zestawy>
  + <mws>
  - <mps>
    <postep zestaw="Z1" sciana="s111">4.5</postep>
    <postep zestaw="Z1" sciana="s112">4.5</postep>
    <postep zestaw="Z2" sciana="s111">4.7</postep>
    <postep zestaw="Z3" sciana="s111">4</postep>
    <postep zestaw="Z2" sciana="s112">4.7</postep>
    <postep zestaw="Z3" sciana="s112">4</postep>
    <postep zestaw="Z1" sciana="s113">4.5</postep>
    <postep zestaw="Z2" sciana="s113">4.7</postep>
    <postep zestaw="Z3" sciana="s113">4</postep>
    <postep zestaw="Z6" sciana="s121">4.8</postep>
    <postep zestaw="Z7" sciana="s121">6.7</postep>
    <postep zestaw="Z8" sciana="s121">5.2</postep>
    <postep zestaw="Z9" sciana="s121">6.2</postep>
```

Rys. 9. Określenie wartości średniej postępu w poszczególnych wyrobiskach z określonym wyposażeniem

```
<?xml version="1.0"?>
- <kopalnia>
  + <sciany>
  + <ciagi>
  + <zestawy>
  + <mws>
  + <mps>
  - <mos>
    <odchylenie zestaw="Z1" sciana="s111">1.64</odchylenie>
    <odchylenie zestaw="Z1" sciana="s112">1.64</odchylenie>
    <odchylenie zestaw="Z2" sciana="s111">1.75</odchylenie>
    <odchylenie zestaw="Z3" sciana="s111">1.86</odchylenie>
    <odchylenie zestaw="Z2" sciana="s112">1.75</odchylenie>
    <odchylenie zestaw="Z3" sciana="s112">1.86</odchylenie>
    <odchylenie zestaw="Z1" sciana="s113">1.64</odchylenie>
    <odchylenie zestaw="Z2" sciana="s113">1.75</odchylenie>
    <odchylenie zestaw="Z3" sciana="s113">1.86</odchylenie>
    <odchylenie zestaw="Z6" sciana="s121">2.08</odchylenie>
    <odchylenie zestaw="Z7" sciana="s121">1.97</odchylenie>
    <odchylenie zestaw="Z8" sciana="s121">1.64</odchylenie>
    <odchylenie zestaw="Z9" sciana="s121">2.3</odchylenie>
```

Rys. 10. Zapis odchyleń standardowych postępu robót eksploatacyjnych w pliku wejściowym

Do pozostałych danych wejściowych należą:

- wydobywanie planowane [Mg/m-c],
- czasookres analizy [m-c],
- czas trwania robót zbrojeniowych i likwidacyjnych [m-c],
- współczynnik strat eksploatacyjnych i przeróbczych [%],
- liczba losowań postępu robót eksploatacyjnych w planowanych wyrobiskach ($N = \min. 30$),

oraz ustawienia algorytmu ewolucyjnego takie jak:

- liczebność populacji bazowej P ,
- liczebność populacji rodzicielskiej I ,
- liczebność elity h ,
- liczba iteracji (generacji) algorytmu.

Są one zdeterminowane wewnątrz algorytmu obliczeniowego, natomiast istnieje możliwość ich zmiany, co opisano w sekcji Zaawansowane użycie.

3.3. Uruchomienie obliczeń


Wprowadzenie pliku wejściowego następuje poprzez naciśnięcie ikony *Upload file* w Oknie 3. Symulacja uruchamiana jest w Oknie 4 przyciskiem *Run* (Rys. 11).



Rys. 11. Uruchomienie obliczeń - Okno 3

3.4. Dane wyjściowe

Wyniki obliczeń prezentowane są w postaci liczbowej (plik .xml) jak i graficznej (wykres wartości wydobywania w analizowanych miesiącach wraz z wydobywaniem planowanym i możliwym odchyleniem – w Oknie 5 (Rys. 12).

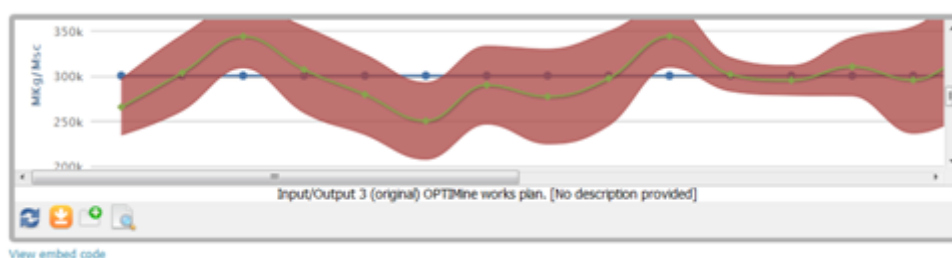

Rys. 12. Okno 5 - wyniki eksperymentu obliczeniowego

Struktura pliku .xml z wynikami obliczeń przedstawiona została na Rys. 13. Jest on dostępny w Oknie 5, po naciśnięciu ikony *download file*.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
- <worksPlans>
  - <plan index="1">
    + <productionSeriesList>
      <startTime>2012-01-01</startTime>
      <monthlyOutput>1479977,1039340,947784,938728,1179121,
    </plan>
  </worksPlans>
```

Rys. 13. Struktura pliku wyjściowego

Podstawowymi elementami struktury pliku wyjściowego są:

- numer planu,
- lista ciągów produkcyjnych,
- podanie daty rozpoczynającej analizowany okres (domyślnie okres ten wynosi 24 miesiące),
- wielkość wydobywania w analizowanym okresie - wartość średnia sumy wydobywania z poszczególnych ciągów produkcyjnych wchodzących w skład kopalni (lub przedsiębiorstwa wielozakładowego) [Mg],
- odchylenie standardowe wydobywania w analizowanym okresie [Mg].

W rozwinięciu listy ciągów produkcyjnych znajdują się szczegółowe informacje dotyczące (Rys. 14):

- numerów ścian wchodzących w skład ciągu,
- wybranych zestawów ścianowych do planowanych wyrobisk,
- średnie postępy robót eksploatacyjnych – wylosowane z zadanego (w danych wejściowych) rozkładu [m/d],
- daty rozpoczęcia i zakończenia robót zbrojeniowych,
- daty rozpoczęcia i zakończenia robót likwidacyjnych.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
- <worksPlans>
  - <plan index="1">
    - <productionSeriesList>
      - <productionSeries startTime="2010-12-01" name="CP51">
        - <walls>
          - <wall name="s511" assembly="Z17">
            <progress>10.384218515405328</progress>
            - <phases>
              <reinforcementStart>2010-12-01</reinforcementStart>
              <exploitationStart>2011-03-01</exploitationStart>
              <liquidationStart>2011-05-29</liquidationStart>
              <liquidationEnd>2011-08-27</liquidationEnd>
            </phases>
          </wall>
          + <wall name="s512" assembly="Z17">
          + <wall name="s513" assembly="Z17">
        </walls>
      </productionSeries>
    - <productionSeries startTime="2011-03-09" name="CP11">
      - <walls>
        - <wall name="s112" assembly="Z2">
          <progress>6.801907918273523</progress>
          - <phases>
            <reinforcementStart>2011-03-09</reinforcementStart>
            <exploitationStart>2011-06-07</exploitationStart>
            <liquidationStart>2012-01-05</liquidationStart>
            <liquidationEnd>2012-04-04</liquidationEnd>
          </phases>
        </wall>
        - <wall name="s113" assembly="Z1">
          <progress>5.056592648321616</progress>
          - <phases>
            <reinforcementStart>2012-04-04</reinforcementStart>
            <exploitationStart>2012-07-03</exploitationStart>
            <liquidationStart>2013-01-26</liquidationStart>
            <liquidationEnd>2013-04-26</liquidationEnd>
          </phases>
        </wall>
      </walls>
    </productionSeries>
  </plan>
</worksPlans>

```

Rys. 14. Szczegóły pliku obliczeniowego


4. Zaawansowane użycie

W celu przeprowadzenia obliczeń w oparciu o inne, niż domyślne, ustawienia algorytmu obliczeniowego, można dokonać zmiany wybranych parametrów. W tym celu należy nacisnąć w Oknie 1 ikonę *Run* (Rys. 15).



Rys. 15. Okno 1 – możliwość zmiany ustawień domyślnych algorytmu obliczeniowego usługi

Otwiera się okno umożliwiające zmianę parametrów, wskazując ich domyślne wartości. Po edycji wybranych parametrów należy nacisnąć przycisk *Send Data* (Rys. 16)

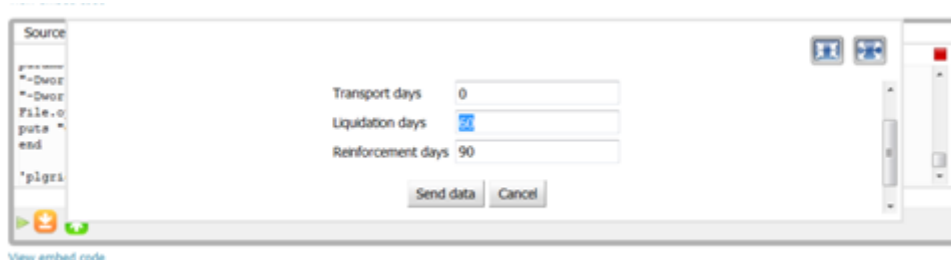

Rys. 16. Okno edycji ustawień algorytmu

Zmienione wartości parametrów wyświetlane są w Oknie 2 (Rys. 17). Powrót do ustawień domyślnych możliwy jest po naciśnięciu ikony *Refresh*.



Rys. 17. Okno 2 – ustawienia parametrów algorytmu obliczeniowego

Parametry możliwe do edycji przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1.

Nazwa parametru	Opis	Wartość domyślna	Uwagi
Transport time (days)	Czas trwania transportu zestawów ścianowych pomiędzy ciągami produkcyjnymi	0	
Liquidation time (days)	Czas trwania robót likwidacyjnych	90	
Reinforcement time (days)	Czas trwania robót zbrojeniowych	90	
Optimization start	Data początku okresu podlegającego optymalizacji	2013-01-01	
Optimization end	Data końca okresu podlegającego optymalizacji	2014-12-31	
No of simulation per evolution	Liczba losowań w każdej generacji algorytmu ewolucyjnego	100	Losowania wartości postępu robót eksploatacyjnych z podanych rozkładów zmiennych losowych
Elite quantity	Liczebność elity	2	Powinna być mała, bo wpływa na silną zbieżność algorytmu
Individuals quantity	Liczebność populacji bazowej	200	
Parents quantity	Liczebność populacji rodzicielskiej	7	
Macro enabling threshold	Maksymalna liczba generacji, tworzonych poprzez stosowanie mikromutacji, bez poprawy najlepszego osobnika	25	Mikromutacja - losowa zmiana wyposażenia w jednym wyrobisku
Max no of macro mutations	Maksymalna liczba makromutacji	2	Makromutacja - losowa zmiana wyposażenia (na dowolne z możliwych opcji wyposażenia) w każdym wyrobisku jednocześnie
Fitness values per month (comma separated)	Planowana wielkość wydobycia	300 000	Podawana dla każdego miesiąca okresu podlegającego optymalizacji oddzielnie (po przecinku)

Gdzie szukać dalszych informacji?

W razie wątpliwości lub problemów, prosimy o [kontakt z nami](#).
